



Programme National de Développement Participatif

REUNION BBL WASHINGTON Juin 2019

SOMMAIRE

1. **Contexte et objectifs de développement**
2. **Principaux résultats**
3. **Dispositif de mise en œuvre**
4. **Facteurs clés ayant affectés la mise en œuvre des activités**
5. **Leçons et points d'attention**



Réunion BBL du 12 juin 2019

1. Contexte et objectifs de développement

Le PNDP; Prêt Programme IDA évolutif, conçu pour 03 phases de 4 ans :

Phase 1 (2004 – 2009), d'initiation avec 155 communes dans 6 régions,

Phase 2 (2010 – 2013) d'extension à 329 communes dans les 10 régions

Phase 3 depuis avril 2016, de consolidation dans les 360 communes

Programme multi bailleurs dont la 3^{ème} phase est financée par :

- ❑ **IDA : 70 millions USD,**
- ❑ ETAT HORS C2D : 56 millions USD,
- ❑ ETAT C2D : 20 millions d'Euro,
- ❑ Bénéficiaires : 07 millions USD,
- ❑ FFU de l'UE : 9,363 millions d'Euro,
- ❑ FED de l'UE : 27,9 millions d'Euro.

1. Contexte et objectifs de développement

OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DU PNDP III

Renforcer la gestion des finances publiques locales ainsi que les processus participatifs de développement au sein des communes en vue de garantir la fourniture des infrastructures et des services socio-économiques durables et de qualité

1. Contexte et objectifs de développement

COMPOSANTES	OBJECTIFS
1 Appui au développement Local	<ul style="list-style-type: none">- Contribuer à l'amélioration des conditions socio-économiques, y compris l'accroissement de la productivité des ressources naturelles de base
2 Appui aux Communes dans le cadre de la décentralisation	<ul style="list-style-type: none">- Appuyer les réformes institutionnelles en cours;- Renforcer les capacités techniques, opérationnelles des communes et autres acteurs dans le processus de décentralisation
3 Coordination, gestion, Suivi-Evaluation et communication	<ul style="list-style-type: none">- Coordonner les activités avec les partenaires institutionnels ;- Gérer, suivre, évaluer et communiquer sur le Programme

1. Contexte et objectifs de développement

OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES	OBJECTIFS
1. Plan de Développement des Peuples Pygmées	Renforcer la dignité des BBBB par les appuis ciblés dans les domaines de la citoyenneté, l'éducation, la santé, l'agriculture, etc.
2. ASGIRAP	Réduire les conflits agropastoraux par la mise en place et l'animation des instances de concertation au niveau local et communal
3. Volet REDD+	Contribuer à l'élaboration de la stratégie nationale REDD+
4. Opération Radios Communautaires	Faciliter l'accès à l'information aux communautés locales par la couverture des zones d'ombre
5. Volet Agropastoral	Faire du secteur rural un moteur important de l'économie nationale dans les zones d'intervention du Projet
6. Volet HIMO	Construire les infrastructures socio-économiques et faciliter l'insertion des jeunes désœuvrés en zone d'insécurité.

1. Contexte et objectifs de développement

- Contexte **sécuritaire très préoccupant** dans certaines régions
- **Déplacés internes et réfugiés nigériens et centrafricains (plus de 1.2 millions)** liés à Boko Haram et au conflit en République Centrafricain,
- **Forts besoins d'assistance humanitaire** dans les régions du Nord-Ouest et le Sud-Ouest, liés aux déplacés internes (plus de 450 000), accentuant ainsi la fragilité des **femmes et enfants**
- Développement par le Gouvernement d'une lettre de Politique pour la protection des personnes déplacées et des réfugiés visant à mettre en place des solutions durables
- Développement en cours d'une approche intégrée **par 4 projets existants et/ou en préparation sur financement additionnel de IDA18-** (d'un montant total de US\$130 millions dont 40 millions pour le PNDP) pour soutenir les réfugiés et leurs communautés hôtes

1. Contexte et objectifs de développement

- Autre réponse au contexte sécuritaire dans la région de l'Extrême-nord

- Le PNDP avec l'appui de l'AFD a développé depuis 2015, une approche à Haute Intensité de Main Œuvre (HIMO) pour la mise en œuvre des infrastructures socio-économiques et l'emploi et l'insertion socioprofessionnelle des jeunes



2. Principaux résultats du PNDP III

- **329** PCD réalisés et en cours d'actualisation, et 23 nouveaux PCD en cours d'élaboration dans les communes d'arrondissement.
- **Portefeuille de 2 038 microprojets sur la base de deux guichets dont l'un portant sur l'équité et l'autre sur la Performance, portant à plus de 6000 microprojets pour les 03 phases ;**
- **Activités d'engagement citoyen:** (i) Développement des solutions endogènes, (ii) ScoreCard, (iii) Evaluation des Communes au Guichet Performance depuis 03 éditions, et (iv) Mise en place d'un mécanisme de gestion des plaintes doté d'un numéro vert : le




2. Principaux résultats du PNDP III

- **Progiciel d'aide au Développement Participatif (Pro_ADP)** installé dans les 360 communes;
- **Sur les 360 communes ayant installé le progiciel SIM_BA**, dont 293 produisent les comptes de gestion et les comptes administratifs;
- **Renforcement des capacités des acteurs locaux** dans des domaines variés



3. Dispositif de mise en œuvre

▪ Sur le plan institutionnel

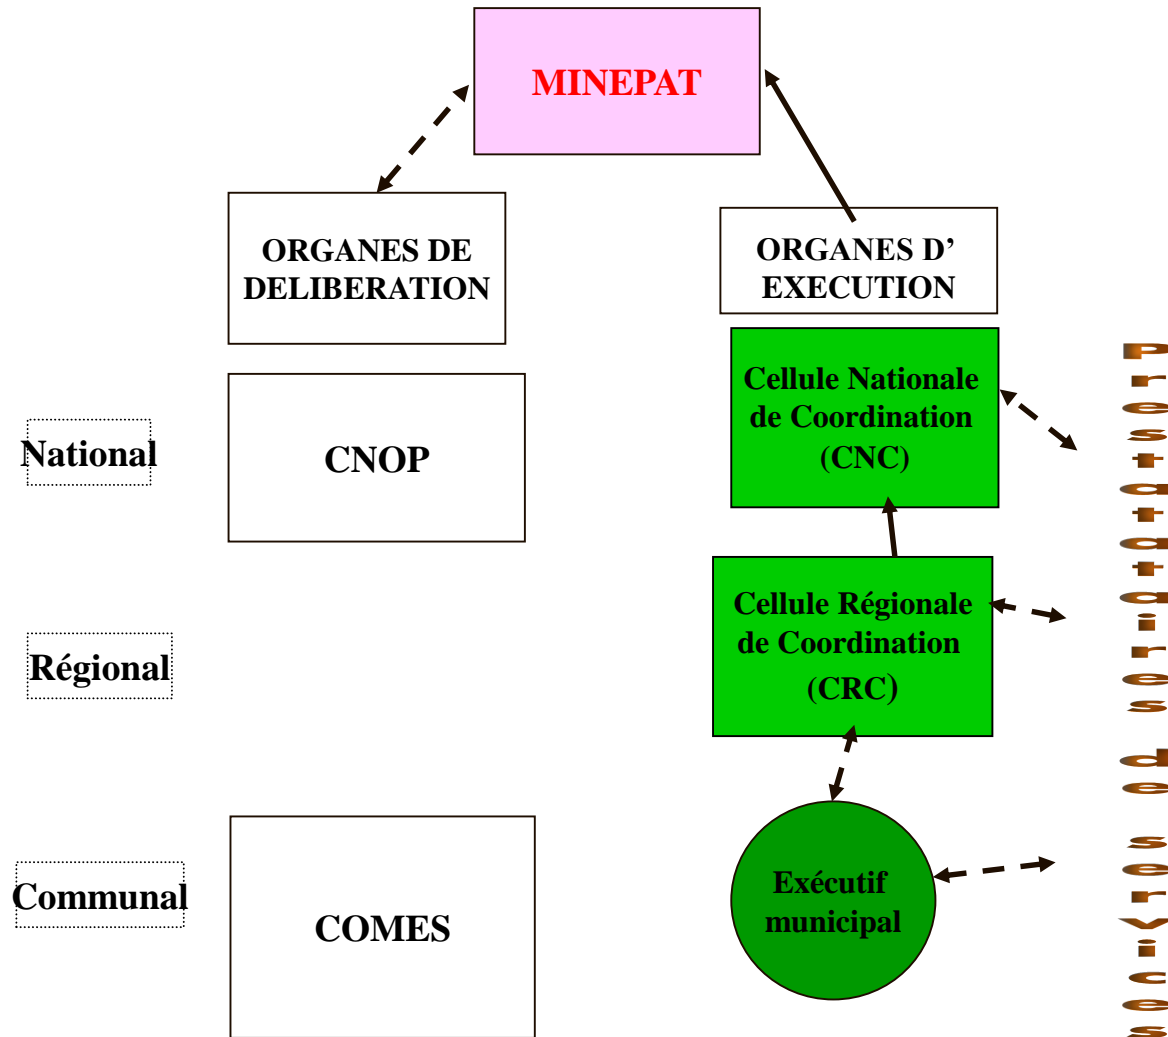

4. Facteurs clés ayant affecté la mise en œuvre

Points faibles :

- ❖ Difficultés de mobilisation de la contribution des bénéficiaires ;
- ❖ Difficultés de mobilisation des fonds de contrepartie et des autres financements ;
- ❖ Insuffisance de professionnalisme des prestataires de services;
- ❖ Aggravation du contexte sécuritaire dans certaines régions ;
- ❖ Inadéquation du mécanisme d'approvisionnement des comptes joints.

4. Facteurs clés ayant affecté la mise en œuvre

Points faibles :

- ❖ Lenteurs dans le traitement des dossiers à la CAA et au Trésor ;
- ❖ Absence de la charte de déconcentration ;
- ❖ Difficulté d'insertion socio-professionnelle des Baka, Bagyéli, Bakola et Bedzang (BBBB), ayant pourtant reçu une formation professionnelle (santé, éducation, etc.) ;
- ❖ Absence d'un cadre de discrimination positive, en faveur des BBBB

4. Facteurs clés ayant affecté la mise en œuvre

Points forts :

- ❖ Volonté des partenaires techniques et financiers d'accompagner le gouvernement ;
- ❖ Forte implication des ministères sectoriels et des autorités administratives dans la mise en œuvre du Programme;
- ❖ Mécanisme idoine de mobilisation des fonds IDA, basé sur les besoins nets ;
- ❖ Développement d'une approche de planification dans les Communes d'arrondissement, mise en cohérence avec les documents de planification urbaine

5. Leçons et points d'attention

Leçons :

- ❖ Le Financement des communes par un système d'allocation peut améliorer substantiellement le choix des investissements et la gouvernance locale ;
- ❖ La mise en compétition des communes (guichet performance), améliore l'exercice de la maîtrise d'ouvrage communale et la gestion ;
- ❖ La promotion des solutions endogènes améliore la responsabilisation et l'appropriation du processus participatif par les communautés à la base, et constitue un puissant axe d'impulsion du développement local ;
- ❖ La plateforme mise en place dans les communes abritant les BBBB constitue un outil de planification et de rationalisation des interventions ;

5. Leçons et points d'attention

Leçons :

- ❖ Les communes sont capables de gérer des ressources beaucoup plus importantes, moyennant un léger accompagnement ;
- ❖ La généralisation de l'utilisation du logiciel SIM_Ba améliore la tenue de la comptabilité, la gestion budgétaire, le processus de mobilisation et de sécurisation des recettes propres de la commune ainsi que la reddition des comptes ;
- ❖ Le PCD est considéré, comme principal outil d'identification des projets pour tous les acteurs de développement, y compris pour l'élaboration du BIP depuis 2012

5. Leçons et points d'attention

Points d'attention :

- ❖ Poursuite de la réflexion sur la pérennisation des acquis du PNDP ;
- ❖ Densification et structuration des activités sur l'engagement citoyen ;
- ❖ Amélioration de la coordination des interventions au niveau communal notamment avec les humanitaires ;
- ❖ Capitalisation des enseignements tirés du Guichet Performance ;
- ❖ Mise en œuvre des interventions du PNDP dans les zones d'insécurité.

**MERCI POUR VOTRE
BIENVEILLANTE ATTENTION**



Programme National de Développement Participatif
